

Grüezi!

Willkommen zum Praxisbericht

Überblick

- ▶ **JIRA als Issue Management System**
- ▶ **GreenHopper für agile Software-Entwicklung (Scrum) in JIRA**
 - ▶ **Versionen und Sprint Backlogs**
 - ▶ **Planning Board**
 - ▶ **Task Board**
 - ▶ **Chart Board**
 - ▶ **Released Board**
- ▶ **Betriebswirtschaftliche Aspekte**
 - ▶ **Tempo Plugin**
 - ▶ **Zusätzliche Reports**

malik malik-management.com, Webseite Phase Grün und MyMalik-Kundenplattform, 2010-3Q / MLK-128

Abonnements und Account-Typen gemäss Konzept Kapitel 8.; Entwicklung der zugehörigen Funktionen

[Edit](#)
[Assign](#)
[Assign To Me](#)
[Comment](#)
[Log Work](#)
[More Actions](#)
[assign for time estimate](#)
[assign for task breakd...](#)
[Workflow](#)

Views

Details

Type: Agile: Story
 Priority: major
 Component/s: MyMalik Kundenplattform

Status: accepted
 Resolution: Unresolved
 Fix Version/s: Gesamtprojekt, Realisierungsphase, Release 2.1, Golive Foren und Lösungskonfigurator, Sprint Backlog 19 ...

Labels: None
 insign Work Type: Development
 Rank: Disabled

People

Assignee: Jan Rintelen
 Reporter: Philipp Sprecher
 Vote (0)
 Watching (1)

Dates

Created: 19. October 2010, 07:47 PM
 Updated: Saturday 12:00 AM

Time Tracking

Estimated: 48h
 Remaining: 17.9h
 Logged: 22.6h
 Include sub-tasks

Description

Hinweis
 Mit diesem Leistungspaket decken wir den Aufwand gemäss dem Kapitel 8. des zugehörigen Konzepts ab. Es sind damit alle Requirements der Phase 1 betroffen, während die der Phasen 2 und drei explizit ausgeklammert und nicht Projektbestandteil sind.

Programmierung, Entwicklung und Einrichtung an Hand von Drupal-Modulen zur Bereitstellung der geforderten Funktionalität.

Tempo


Issue Links

- This issue **one part moved to:**
- [MLK-163](#) Abonnements, Accounttypen: Implementierung Logik für Studenten-Abos (Spezialfall)
 - [MLK-161](#) Implementierung der Funktionalität für die Verwaltung der Accounttypen im Kontext des Profils
 - [MLK-162](#) Abonnements, Accounttypen: Implementierung Logik: Verknüpfung AccTypen mit Benutzergruppen
- This issue **im gleichen Leistungspaket wie:**
- [MLK-139](#) Abonnements und Account-Typen gemäss Konzept Kapitel 8.; Berücksichtigung des Handlings von mehreren E-Mail-Adressen
 - [MLK-129](#) Abonnements und Account-Typen gemäss Konzept Kapitel 8.; Publishing-Arbeiten im Frontend, User Experience

Sub-Tasks

- Abonnements, Accounttypen: Implementierung Logik für Studenten-Abos (Spezialfall)**
closed Jan Rintelen 100%
- Abonnements, Accounttypen: Implementierung Logik: Verknüpfung AccTypen mit Benutzergruppen**
closed Jan Rintelen 100%
- Up- und Downgrade von Mitgliedschaften über den Kauf eines Abo-Produkts**
planned Timo Schmid 53%

Einsatz von Tools - Praxiserfahrung mit JIRA and GreenHopper

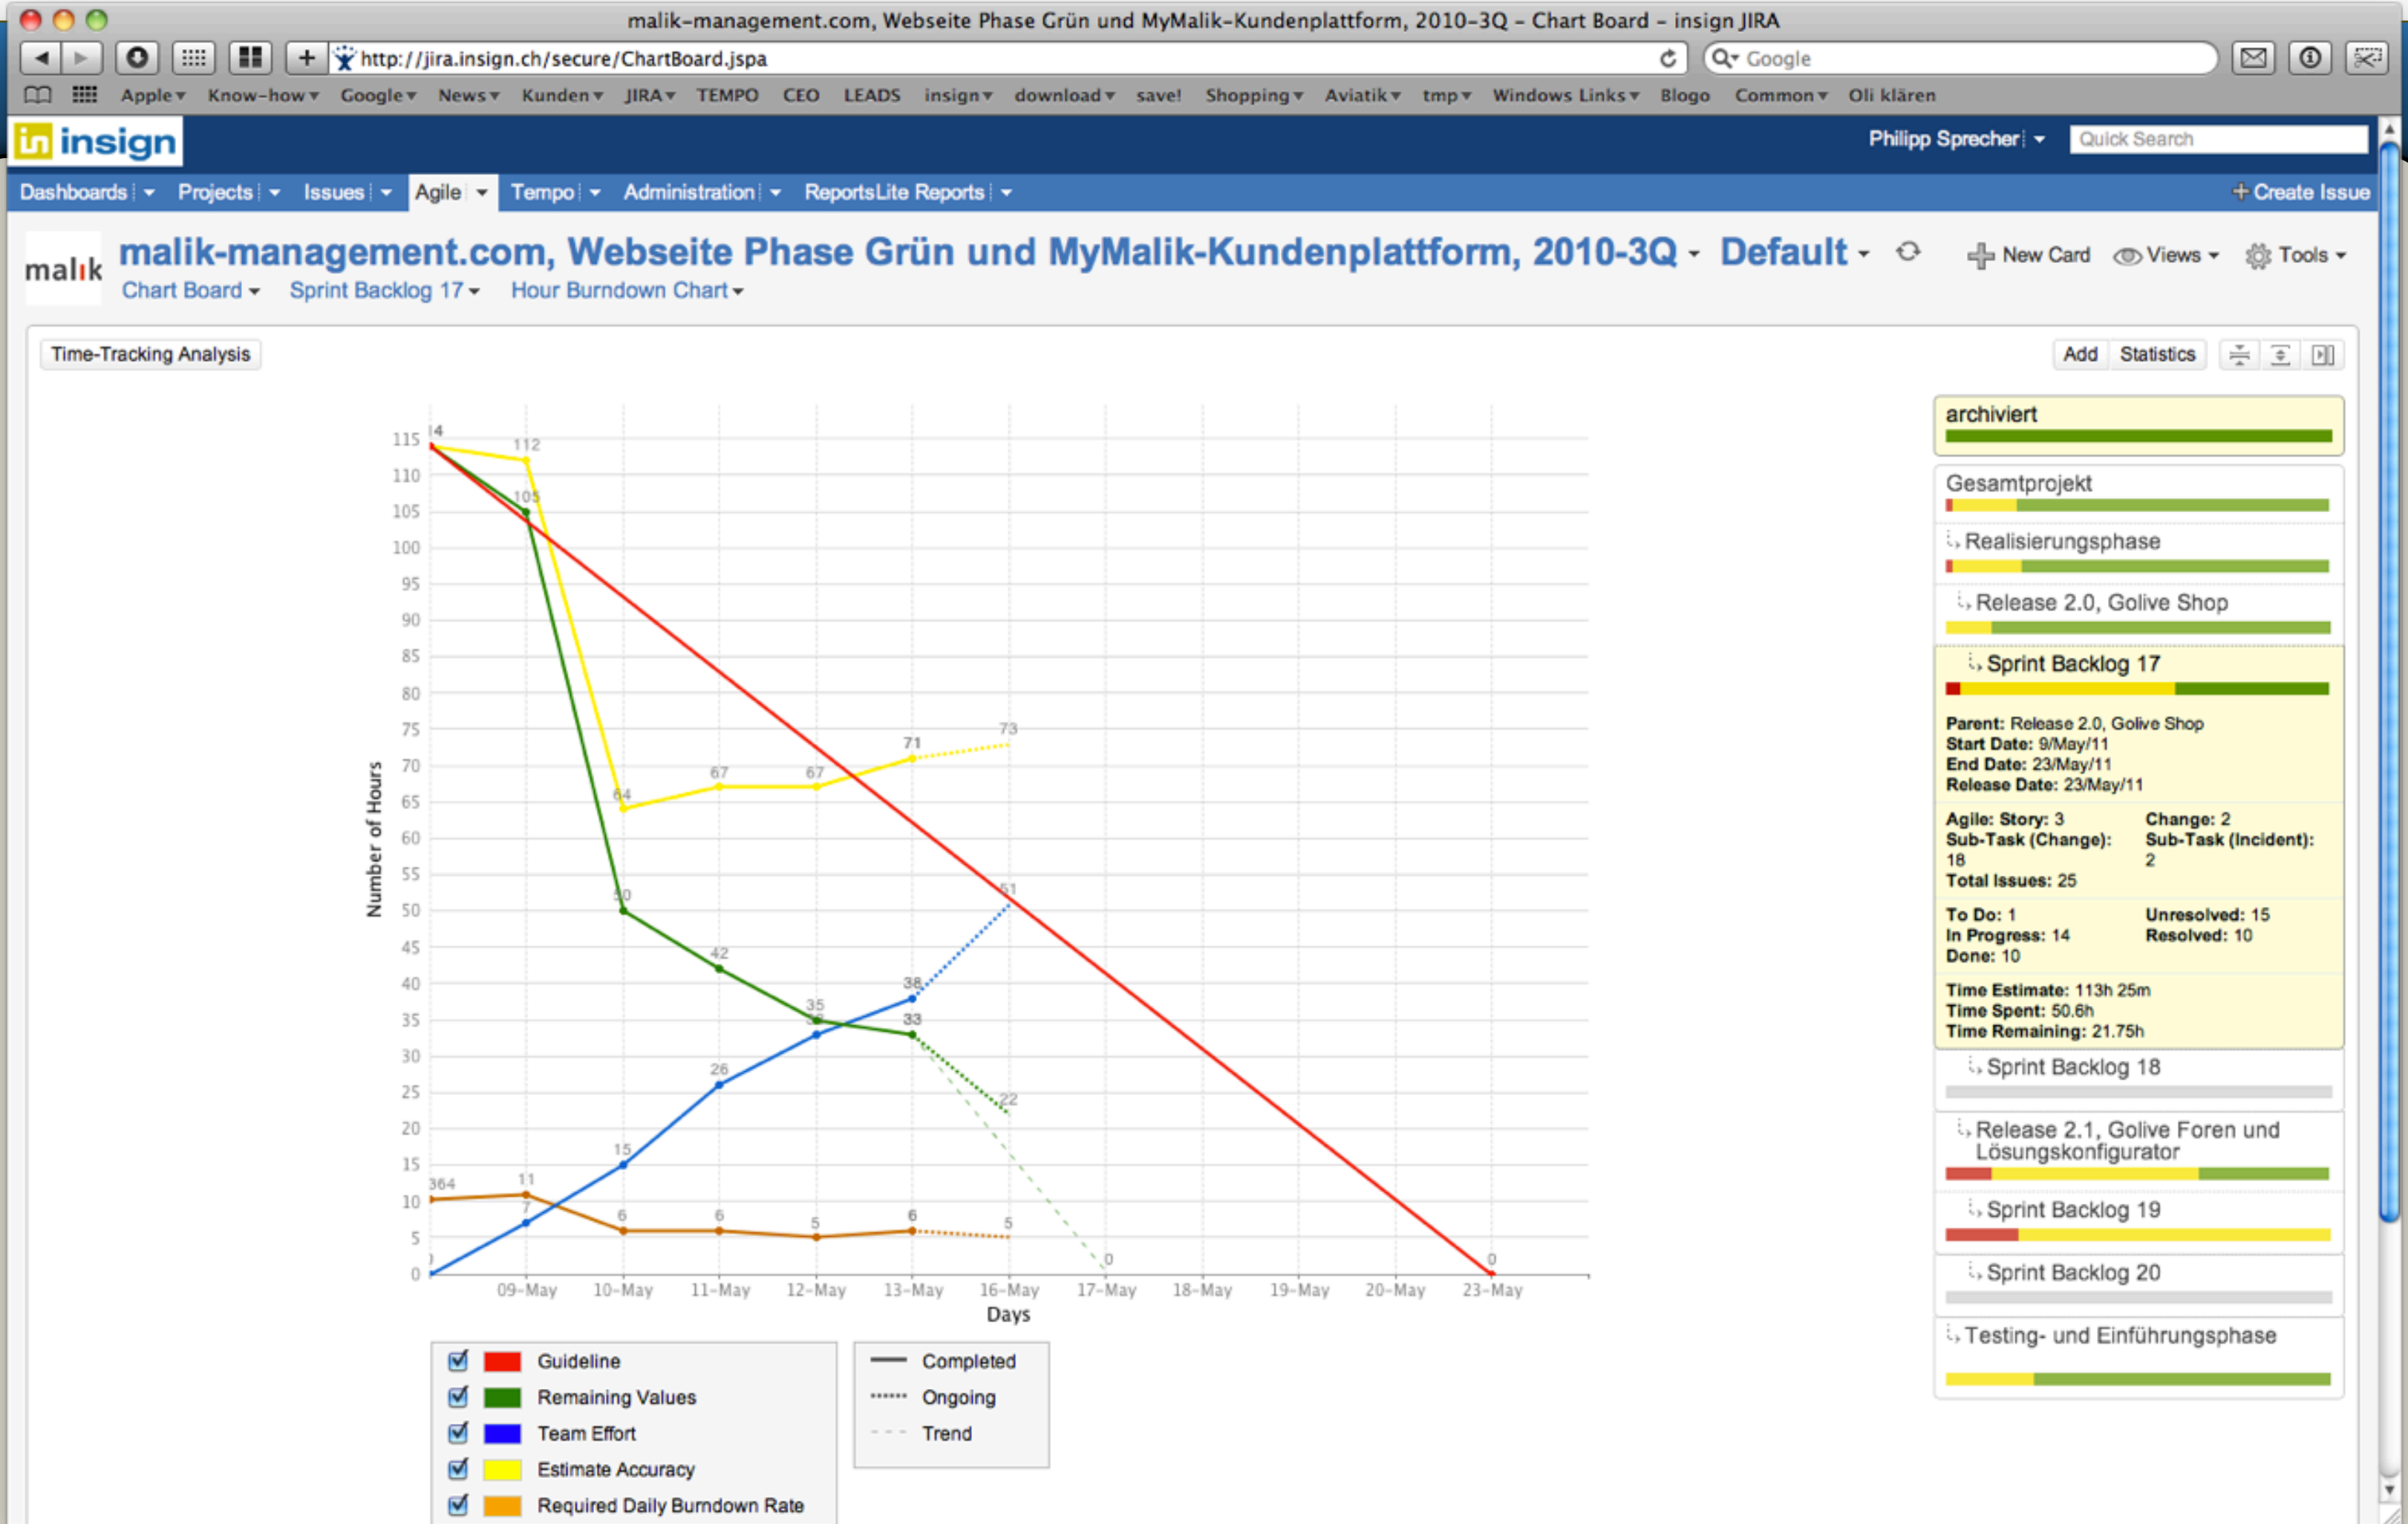

GreenHopper - Versionen und Sprint Backlogs

- ▶ **Verschachtelbare FixVersions**
- ▶ **Backlog mit Start-, End- und Release-Date**
- ▶ **Zeit- und Issue-Übersichten**
- ▶ **Story Points aktivierbar, Velocity messbar**
- ▶ **Integrierte Release Notes**
- ▶ **JIRA Road Map-Ansicht**

malik malik-management.com, Webseite Phase Grün und MyMalik-Kundenplattform, 2010-3Q - Ranked

New Card Views Tools

Planning Board Version Sprint Backlog 17

Only My Issues Only Pending Issues Hide Done Issues Hide Sub-tasks

Add Statistics

<p>MLK-109 60 Subs</p> <p>Shop gemäss Konzept Kapitel 6.3.; Entwicklung der zugehörigen Funktionen Sprint Backlog 17 Roman Kühni</p>	<p>MLK-375 MLK-109</p> <p>Spezialfall Neuregistrierung Sprint Backlog 17 Jan Rintelen</p>	<p>MLK-370 MLK-109</p> <p>Express-Bestellungen für den Export Sprint Backlog 17 Roman Schärli</p>	<p>MLK-399 MLK-109</p> <p>Fehlende MZ-Adress ID bei Kundenregistrierung bei Malik-Shop Sprint Backlog 17 Jan Rintelen</p>	<p>MLK-400 MLK-109</p> <p>Fehlende MZ-Adress ID bei Kundenregistrierung bei Malik-Shop Sprint Backlog 17 Timo Schmid</p>
<p>MLK-364 MLK-109</p> <p>Anpassungen des Bestellprozesses in Abhängigkeit von Rechnungsadressen Sprint Backlog 17 Raphael Mäder</p>	<p>MLK-337 MLK-109</p> <p>MwSt-Codes: Regeln für den Export Sprint Backlog 17 Andreas Frick</p>	<p>MLK-110 23 Subs</p> <p>Shop-Publishing Sprint Backlog 17 Jan Rintelen</p>	<p>MLK-124 3 Subs</p> <p>Produkt-Konfigurator für Personen gem. Konzept Kapitel 5.3.2.1: Front- und Backend, RICHTWERT gem. Sprint Backlog 17 Roman Kühni</p>	<p>MLK-395 MLK-297</p> <p>SPM vom 16.05.2011 Sprint Backlog 17 Jan Rintelen</p>
<p>MLK-382 MLK-126</p> <p>Erfassen / Anpassen neuer Adressen Sprint Backlog 17 Roman Schärli</p>	<p>MLK-228 MLK-126</p> <p>Komfortablere Benutzer- und Rechteverwaltung Sprint Backlog 17 Philipp Sprecher</p>	<p>MLK-381 MLK-136</p> <p>Fehler Synchronisation Sprint Backlog 17 Andreas Frick</p>	<p>MLK-383 MLK-136</p> <p>Fehler im Export Sprint Backlog 17 Andreas Frick</p>	<p>MLK-446</p> <p>Benachrichtigungen gemäss Konzept Kapitel 6.7.; Publishing-Arbeiten im Frontend, User Experience Sprint Backlog 17 Philipp Sprecher</p>
<p>MLK-424</p> <p>Administration gemäss Konzept Kapitel 6.10.; Publishing-Arbeiten im Frontend, User Experience Sprint Backlog 17 Philipp Sprecher</p>	<p>MLK-398 MLK-302</p> <p>Malik Dev Meeting Sprint Backlog 17 Philipp Sprecher</p>	<p>MLK-330 MLK-103</p> <p>Default-Landingpage nach Einloggen auf MyMalik Sprint Backlog 17 Philipp Sprecher</p>	<p>MLK-387 MLK-104</p> <p>MyMalik: Texte übersetzbar machen Sprint Backlog 17 Philipp Sprecher</p>	<p>MLK-459 MLK-106</p> <p>Weiterempfehlungs-E-Mail für Mitglieder: TB und E-Mail (HTML) gestalten Sprint Backlog 17 Jan Rintelen</p>
<p>MLK-453 MLK-106</p> <p>Gestaltung der Site "MyHome" für Mitglieder Sprint Backlog 17 Philipp Sprecher</p>	<p>MLK-307 MLK-107</p> <p>Implementierung Double-Opt-In-Verfahren für E-Mail-Adressen-Änderung Sprint Backlog 17 Patrick Valer</p>	<p>MLK-466 MLK-123</p> <p>Shop, Produkte-Ansicht für Mitglieder: Publishing in HTML Sprint Backlog 17 Philipp Sprecher</p>		

Unscheduled

archiviert

Gesamtprojekt

Realisierungsphase

Release 2.0, Golive Shop

Sprint Backlog 17

Parent: Release 2.0, Golive Shop
Start Date: 9/May/11
End Date: 23/May/11
Release Date: 23/May/11

Agile: Story: 3 Change: 2
Sub-Task (Change): 18 Sub-Task (Incident): 2
Total Issues: 25

To Do: 1 Unresolved: 15
In Progress: 14 Resolved: 10
Done: 10

Time Estimate: 113h 25m
Time Spent: 50.6h
Time Remaining: 50h < 21.75h < 55h

Sprint Backlog 18

Release 2.1, Golive Foren und Lösungskonfigurator

Sprint Backlog 19

Sprint Backlog 20

Testing- und Einführungsphase

Time Remaining (30.75h remaining, 24.25h total)

Capacity (55h) 55h

Only My Issues Hide Done Issues Hide Sub-tasks

To Do - 0h

1 issue

MLK-398
MLK-302

Malik Dev Meeting
Sprint Backlog 17
Philipp Sprecher

In Progress - 3.95h

5 issues

MLK-109
60 Subs

Shop gemäss Konzept Kapitel 6.3.;
Entwicklung der zugehörigen
Funktionen
Sprint Backlog 17
Roman Kühni

MLK-375
MLK-109

Spezialfall Neuregistration
Sprint Backlog 17
Jan Rintelen

MLK-337
MLK-109

MwSt-Codes: Regeln für den Export
Sprint Backlog 17
Andreas Frick

MLK-381
MLK-136

Fehler Synchronisation
Sprint Backlog 17
Andreas Frick

MLK-383
MLK-136

Fehler im Export
Sprint Backlog 17
Andreas Frick

Done - 0h

10 issues

MLK-399
MLK-109

Fehlende MZ-Adress ID bei
Kundenregistration bei Malik-Shop
Sprint Backlog 17
Jan Rintelen

MLK-374
MLK-110

Produktvergleich: Reihenfolge Elemente
Sprint Backlog 17
Philipp Sprecher

MLK-228
MLK-126

Komfortablere Benutzer- und
Rechteverwaltung
Sprint Backlog 17
Philipp Sprecher

MLK-116

Benachrichtigungen gemäss Konzept
Kapitel 6.7.; Publishing-Arbeiten im
Frontend, User Experience
Sprint Backlog 17
Philipp Sprecher

MLK-124

Administration gemäss Konzept Kapitel
6.10.; Publishing-Arbeiten im Frontend,
User Experience
Sprint Backlog 17
Philipp Sprecher

MLK-338
MLK-103

Default-Landingpage nach Einloggen
auf MyMalik
Sprint Backlog 17
Philipp Sprecher

MLK-387
MLK-104

MyMalik: Texte übersetzbar machen
Sprint Backlog 17
Philipp Sprecher

MLK-159
MLK-108

Weiterempfehlungs-E-Mail für
Mitglieder: TB und E-Mail (HTML)
gestalten
Sprint Backlog 17
Jan Rintelen

MLK-153
MLK-106

Gestaltung der Site "MyHome" für
Mitglieder
Sprint Backlog 17
Philipp Sprecher

MLK-166
MLK-123

Shop, Produkte-Ansicht für Mitglieder:
Publishing in HTML
Sprint Backlog 17
Philipp Sprecher

GreenHopper - Chart Board

- ▶ **Gut les- und interpretierbare Charts**
- ▶ **Trends**
- ▶ **Für Sprints und übergeordnete FixVersions**
- ▶ **Nach Stunden, Issues oder Story Points**

GreenHopper - Released Board

- ▶ **Gute Trennung / Archivierung / Ablage**
- ▶ **Release Notes**
- ▶ **Chart-Aufbewahrung**

Betriebswirtschaftliche Aspekte - Tempo Plugin

Apollo - Team Timesheet - insign JIRA

http://jira.insign.ch/secure/Tempo.jspa?reportKey=teamTimesheet&team=3&periodType=BILLING&periodView=PERIOD&period=051

Philipp Sprecher | Quick Search

Dashboards | Projects | Issues | Agile | **Tempo** | Administration | ReportsLite Reports | + Create Issue

Timesheet | Team | Apollo | 1 of 7

Log Work | Previous | Next | Current | Day | Week | Period | Tools

Period: 01/May/11 - 31/May/11

T	Name	Summary	S	Σ	%	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
						S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	F	S	S	M	T		
	Basil Achermann	8 activities	=	53	40.97%		6.2	4.5	1.15	4	4			5.1	5.5	6	4.55	6		6																
	Fabio Viscardi	3 activities	=	67.05	36.28%	1.58	6.62	11.5	3.5	12	6.8			17	6.15		1.7	0.2																		
	Lasse Heiskanen	5 activities	=	87.77	47.49%		8.5	8.18	8.1	8.18	7.5			8.55	8.5	11	8.25	2.83		8.17																
	Martin Rusch	15 activities	=	117.48	63.57%	4.5	16.92	8.5	9.03	8.5	5.83	3.33	2.25	11.92	9.5	14.6	9.25	7.6	3.25	0.33	2.17															
	Michel Maillard	11 activities	=	94.3	51.03%		8.4	8.2	8.6	8.8	8.4			7.9	8.4	9.9	8.4	8.6		8.7																
	Roger Dieter	7 activities	=	67.43	36.49%		8.4	8.88	8.22	8.92	5.25			7.1	8.43	2.82	8.67		0.75																	
	Stefan Pasch	10 activities	=	86.15	46.62%		13	7.03	6.43	6.87				8.5	8.95	9.03	9.55	9.63		7.15																
	Yves Bannwart	9 activities	=	126.53	68.47%		8.42	8.4	8.67	8.42	8.67			8.53	8.3	8.47	8.22	8.4		8.45					8.4					8.4			8.4	8.4	8.4	
Daily hours total:						6.08	76.45	65.2	53.7	65.68	46.45	3.33	2.25	74.6	63.73	61.82	58.58	43.27	3.25	0.33	41.38			8.4						8.4			8.4	8.4	8.4	
Weekly hours total:						6.08	313.07											305.58		49.78			8.4		16.8											
Total hours: 699.72																																				

Bug tracking and project tracking for software development powered by Atlassian JIRA (v4.3.3#617-r149616) | Report a problem

Report - Time By Project Category Report - insign JIRA

http://jira.insign.ch/secure/ConfigureReport.jspa?atl_token=BN1K-MX0V-I9OI-7F27%7C35b02db4a14ac41ec5eafe4e47473d4

Apple Know-how Google News Kunden JIRA TEMPO CEO LEADS insign download save! Shopping Aviatik tmp Windows Links Blog Common Oli klären

insign Philipp Sprecher Quick Search

Dashboards Projects Issues Agile Tempo Administration ReportsLite Reports Create Issue

Report: ReportsLite - Time By Project Category

Start Date: 1/Apr/11 , End Date: 30/Apr/11

Data	Total Time	%
SLA non-Gold Standard	1 days 4.6 hours 46 minutes (49560)	0
internal	212 days 7.199999999999925 hours 20 minutes (6438000)	44
icms Projekte (P36)	7 days 7.199999999999975 hours 14 minutes (238440)	2
Service und Support	66 days 5.599999999999766 hours 54 minutes (2019240)	14

Ihre Fragen

**Zeit für Ihre Fragen und
danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Merci!**
